Fase 3: Gestión del Proyecto

Presentación de informe

Nombre de participantes

Geovanni Andrés Hernández Rubio

David Fernando Alba Rodríguez

Leandro Esteban Moreno Cogua

Emilio José Niño Sánchez

José Luis Rodríguez Cortés

Grupo Colaborativo: 202337121_212

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Proyecto de Ingeniería II

Nombre Docente y nivel de estudio: Juan José Victoria Escarria

Bogotá, D. C., octubre de 2026

Introducción

El presente informe desarrolla la Fase 3: Gestión del Proyecto del proyecto tecnológico “Mujeres Conectadas, Seguras”, una propuesta de aplicación móvil orientada a fortalecer las capacidades de las mujeres emprendedoras y usuarias de teléfonos inteligentes frente a la seguridad digital, la protección de datos personales y el uso responsable de herramientas de marketing digital.

La propuesta contempla recursos educativos, cuestionarios de aprendizaje, orientaciones prácticas, un botón SOS y un chatbot como elementos de apoyo.

Para la gestión del proyecto se adopta el marco de trabajo Scrum, organizando el desarrollo mediante roles, ceremonias, artefactos, incrementos y mecanismos de seguimiento. El informe relaciona cada componente con la plantilla del Anexo 3 – Gestión de Proyectos Ágiles y presenta la información necesaria para comprender la planificación, ejecución y seguimiento del producto.

El documento también presenta los avances de prototipado, con énfasis en las funcionalidades que se desean validar y en la realimentación que debe orientar las siguientes iteraciones.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar y gestionar mediante Scrum el desarrollo de una aplicación móvil denominada “Mujeres Conectadas, Seguras”, orientada a proporcionar recursos prácticos de seguridad digital, protección de datos personales y uso responsable de herramientas de marketing digital para mujeres.

Objetivos específicos

1. Definir la visión, alcance y valor esperado de la solución tecnológica.
2. Identificar los roles, involucrados y responsabilidades necesarias para la gestión ágil del proyecto.
3. Organizar las ceremonias Scrum y establecer una secuencia de Sprints para desarrollar incrementos funcionales.
4. Construir y priorizar el Product Backlog de acuerdo con las necesidades identificadas.
5. Definir tareas, impedimentos, criterios de aceptación y condiciones de terminación del trabajo.
6. Representar el avance mediante herramientas de seguimiento como el Scrum Board y el Burndown Chart.
7. Desarrollar avances de prototipado que permitan validar la navegación y las funcionalidades principales.

Proyecto Tecnológico

Descripción del proyecto tecnológico

"Mujeres Conectadas, Seguras" es una aplicación móvil concebida como recurso de apoyo para mujeres emprendedoras y usuarias de dispositivos móviles que requieren fortalecer sus conocimientos y prácticas relacionadas con la seguridad digital. La solución busca presentar información clara y práctica sobre amenazas digitales, contraseñas seguras, protección de datos, vulnerabilidades y uso responsable de herramientas de marketing digital.

La aplicación se estructura alrededor de módulos de aprendizaje y evaluación. Como complemento, se contempla un botón SOS y un chatbot para facilitar la orientación del usuario. También puede incorporarse un sistema de logros como mecanismo opcional de motivación.

Caso del negocio y visión

El caso del negocio y la visión del producto establecen el problema que se pretende atender, la población objetivo, el propósito de la solución, el valor esperado y los elementos principales del alcance. La información detallada se encuentra diligenciada en la hoja "Caso del Negocio y Visión" del Anexo 3.

Figura 1: Caso del negocio y vision – Anexo 3

Proyecto: Mujeres Conectadas, Seguras

Problema identificado: mujeres emprendedoras y usuarias de teléfonos inteligentes pueden estar expuestas a riesgos de seguridad digital, pérdida o exposición de datos personales, contraseñas débiles, fraudes, suplantación y uso poco responsable de herramientas de marketing digital. La ausencia de un recurso móvil centralizado, sencillo y educativo dificulta la prevención y la respuesta inicial ante estas situaciones.

Objetivo general: desarrollar una aplicación móvil educativa y de apoyo que fortalezca la seguridad digital, la protección de datos personales y el uso responsable de herramientas de marketing digital.

Objetivos específicos: ofrecer contenidos prácticos sobre amenazas y buenas prácticas; orientar la creación y gestión de contraseñas seguras; incorporar cuestionarios para reforzar el aprendizaje; disponer de un Botón SOS y un chatbot de orientación; promover prácticas responsables de protección de datos y marketing digital; y validar funcionalmente el producto mediante criterios de aceptación.

Alcance: aplicación móvil con perfil de usuario, módulos educativos, cuestionarios, seguimiento de avances, Botón SOS, chatbot y recomendaciones sobre protección de datos y marketing digital.

Limitaciones: disponibilidad de tiempo y recursos del equipo, necesidad de validación de contenidos, dependencia de servicios de terceros para algunas funciones y alcance académico del prototipo.

Columna1	Project Vision
OPORTUNIDAD O NECESIDAD	Necesidad de fortalecer la seguridad digital, la protección de datos personales y el uso responsable de herramientas digitales y de marketing.
EL	Mujeres Conectadas, Seguras: aplicación móvil educativa y de orientación en seguridad digital.
BENEFICIOS	Aprendizaje práctico, prevención de riesgos, consulta rápida, cuestionarios de autoevaluación y orientación mediante SOS y chatbot.
A DIFERENCIA	Información dispersa y poco adaptada al contexto de las usuarias, sin una experiencia integrada de aprendizaje y orientación.
NUESTRO PRODUCTO	Una aplicación móvil sencilla, accesible y centrada en las necesidades de las usuarias, con contenidos organizados, interacción y orientación ante situaciones de riesgo.

Descripción y explicación: La figura debe mostrar la relación entre la necesidad identificada, la propuesta de solución y el valor que se espera generar. En el contexto del proyecto, la visión permite mantener el desarrollo orientado a una solución accesible, educativa y centrada en las necesidades de las usuarias.

Identificación De Roles

Scrum distribuye responsabilidades para favorecer la transparencia, inspección y adaptación. Para este proyecto se consideran los siguientes roles y participantes:

Rol/Involucrado	Responsabilidad dentro del proyecto
Product Owner	Representar las necesidades del producto, priorizar el Product Backlog y validar que los incrementos aporten valor.
Scrum Master	Facilitar Scrum, apoyar al equipo, promover las ceremonias y ayudar a gestionar impedimentos.
Equipo de desarrollo	Analizar, diseñar, prototipar, implementar, probar y documentar los incrementos del producto
Usuarias objetivo	Aportar necesidades y realimentación sobre comprensión, utilidad, navegación y funcionalidades.
Stakeholders académicos	Acompañar el seguimiento académico, revisar avances y aportar observaciones pertinentes.

Figura 2: Involucrados del proyecto – Anexo 3

Involucrados en del Proyecto						
Involucrado	Rol	Tipo	Descripicion del rol	Descripción de la persona(s)	Mail	Movil
Geovanni Andrés Hernández Rubio	SDT1 (Software Development team)	CORE	Analiza, diseña y desarrolla funcionalidades, apoya las pruebas y la integración técnica.	Integrante del equipo académico	gahernandezrubio@gmail.com	3118632892
Emilio	SDT2	CORE	Apoya el desarrollo, pruebas,	Integrante del equipo académico		
Equipo de desarrollo	SDT3	CORE	Apoya diseño, pruebas, integración y	Integrante del equipo académico		
Mujeres emprendedoras	Clientes / usuarios finales	NO CORE	Utilizan los contenidos y	Público objetivo		
Usuarias de smartphone	Clientes / usuarios finales	NO CORE	Interactúan con módulos educativos,	Público objetivo		
UNAD	Patrocinadores	NO CORE	Contexto académico y seguimiento	Institución educativa		
Docente / tutor	Proveedor o soporte	NO CORE	Orientación metodológica, revisión	Acompañamiento académico		
Servicios tecnológicos	Proveedor o soporte	NO CORE	Soporte de servicios o componentes	Servicios de terceros		

Descripción y explicación: La imagen permite visualizar los participantes y su relación con el proyecto. La identificación temprana de involucrados facilita determinar quién aporta información, quién toma decisiones sobre el producto y quién participa en la validación de los incrementos.

Identificación de Ceremonias

(Sprint planning – Daily Scrum – Product Backlog Refinement – Sprint review – Sprint retrospective – Scrum timeline)

Las ceremonias permiten inspeccionar el avance y adaptar el trabajo. Para el proyecto se contemplan:

Ceremonia	Propósito	Aplicación al proyecto
Sprint Planning	Planificar el trabajo del Sprint.	Seleccionar historias prioritarias y definir el objetivo del Sprint.
Daily Scrum	Inspeccionar el progreso y ajustar el trabajo.	Revisar avances, trabajo pendiente e impedimentos del equipo.
Product Backlog Refinement	Preparar y clarificar elementos futuros.	Precisar historias, criterios de aceptación, prioridades y estimaciones.
Sprint Review	Inspeccionar el incremento con los interesados.	Presentar las funcionalidades desarrolladas y recoger realimentación.
Sprint Retrospective	Reflexionar sobre el proceso de trabajo.	Identificar mejoras para el siguiente Sprint.
Scrum Timeline	Visualizar la secuencia temporal.	Organizar los Sprints y eventos principales del proyecto.

El Release Plan organiza cuatro Sprints de aproximadamente tres semanas, sujetos a la planificación académica y a la capacidad real del equipo:

Sprint	Enfoque	Incremento esperado
Sprint 1	Base del producto	Estructura inicial, navegación y definición de módulos.
Sprint 2	Aprendizaje y evaluación	Contenido educativo y cuestionarios.
Sprint 3	Orientación y respuesta	Botón SOS y chatbot.
Sprint 4	Validación y cierre	Pruebas, ajustes, integración y preparación del incremento final.

Figura 3: Release Plan y Puntos – Anexo 3

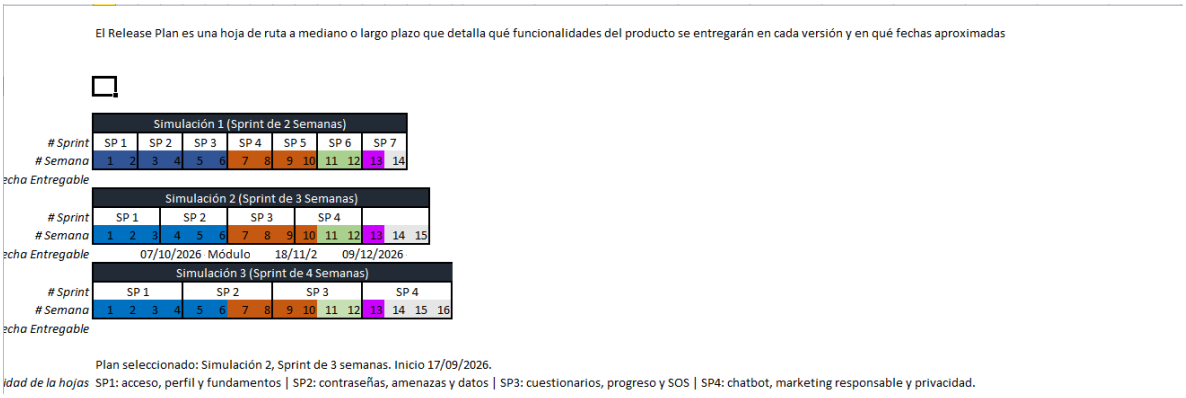
BLES			ESTIMACIÓN SPRINTS			
Equivalencia Release Esfuerzo	Unidad		Puntos (Planning Pocker)	Equivalencia Release Esfuerzo	Unidad	Consideraciones generales para la estimación
3	días	SPRINT 1	1	1	día	Con un sprint de 3 semanas
1	semanas		2	2	días	
2	semanas		3	4	días	
2,5	semanas		5	1	Semana	
4	semanas		8			
6	semanas		13			
8/2	semanas /meses		21			
12/3	semanas /meses		34			
			∞			

SPRINT 1	Puntos (Planning Pocker)	Equivalencia Release Esfuerzo	Unidad	Consideraciones generales para la estimación
	1	1	día	Escala orientativa para un Sprint de 3 semanas; se usa Planning Poker y la complejidad relativa de cada historia.
	2	2	días	
	3	4	días	
	5	1	semana	
	8	1,5	semanas	
	13	2	semanas	
	21	3	semanas	
	34	5	semanas	
	∞			

SPRINT 2	Puntos (Planning Pocker)	Equivalencia Release Esfuerzo	Unidad	Consideraciones generales para la estimación
	1	1	día	Escala orientativa para un Sprint de 3 semanas; se usa Planning Poker y la complejidad relativa de cada historia.
	2	2	días	
	3	4	días	
	5	1	semana	
	8	1,5	semanas	
	13	2	semanas	
	21	3	semanas	
	34	5	semanas	
	∞			

SPRINT 3	Puntos (Planning Pocker)	Equivalencia Release Esfuerzo	Unidad	Consideraciones generales para la estimación
	1	1	día	Escala orientativa para un Sprint de 3 semanas; se usa Planning Poker y la complejidad relativa de cada historia.
	2	2	días	
	3	4	días	
	5	1	semana	
	8	1,5	semanas	
	13	2	semanas	
	21	3	semanas	
	34	5	semanas	
	∞			

	Puntos (Planning Pocker)	Equivalencia Release Esfuerzo	Unidad	Consideraciones generales para la estimación
SPRINT 4	1	1	día	Escala orientativa para un Sprint de 3 semanas; se usa Planning Poker y la complejidad relativa de cada historia.
	2	2	días	
	3	4	días	
	5	1	semana	
	8	1,5	semanas	
	13	2	semanas	
	21	3	semanas	
	34	5	semanas	
	∞			



Descripción y explicación: la imagen representa la planificación temporal de los incrementos. Las ceremonias se repiten durante los Sprints y permiten inspeccionar continuamente el avance, mientras que el Release Plan permite relacionar objetivos, puntos y entregables.

Identificación de Artefactos

Product Backlog

El Product Backlog contiene los elementos funcionales y de trabajo que permiten construir el producto. Su priorización se realiza según el valor esperado y las necesidades identificadas.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Story Points
HU01	Como usuaria quiero registrarme/iniciar sesión para acceder a mis recursos.	Alta	5
HU02	Como usuaria quiero consultar un módulo de seguridad digital para aprender sobre amenazas.	Alta	5
HU03	Como usuaria quiero conocer prácticas para crear contraseñas seguras.	Alta	3
HU04	Como usuaria quiero aprender sobre protección de datos personales.	Alta	5
HU05	Como usuaria quiero responder cuestionarios para	Alta	5

	comprobar lo aprendido.		
HU06	Como usuaria quiero recibir orientación ante situaciones de riesgo digital.	Alta	8
HU07	Como usuaria quiero acceder a un botón SOS para encontrar orientación de apoyo	Alta	8
HU08	Como usuaria quiero interactuar con un chatbot de orientación.	Media	8
HU09	Como usuaria quiero conocer recomendaciones sobre marketing digital responsable.	Media	5
HU10	Como usuaria quiero consultar mis avances o logros de aprendizaje.	Media	3
HU11	Como equipo quiero validar la navegación mediante un prototipo	Alta	5
HU12	Como equipo quiero realizar pruebas y	Alta	8

	corregir errores antes de la entrega.		

Sprint Backlog

El Sprint Backlog corresponde al subconjunto de elementos seleccionados para el Sprint, acompañado por las tareas necesarias para alcanzar el objetivo establecido. Su contenido se gestiona en la hoja “Tareas” del Anexo 3.

Product Increment

El Product Increment es el resultado integrado y utilizable producido durante el Sprint. En este proyecto puede corresponder a módulos navegables, contenidos, cuestionarios, funcionalidades de orientación y componentes del prototipo, siempre que cumplan los criterios definidos.

Figura 4: Product Backlog, Tareas y Gestión de impedimentos – Anexo 3

Product Backlog								
I	TIPO	Priorizaci	Rol/Persor	¿Qué requiere?	UAT	Estimació	Esfuerzo Sem	Product Backlog
1	US	Must	Usuaria final	registrarme e iniciar sesión de forma segura para acceder a la aplicación	El sistema debe validar los datos de acceso y permitir el ingreso únicamente con credenciales válidas.	5	2,5 semanas	Como Usuaria final requiero o necesito registrarme e iniciar sesión de forma segura para acceder a la aplicación con un UAT: El sistema debe validar los datos de acceso y permitir el ingreso únicamente con credenciales válidas.
2	US	Must	Usuaria final	consultar y editar mi perfil para mantener actualizados mis datos y preferencias	El sistema debe permitir visualizar y actualizar los datos autorizados del perfil y guardar los cambios	3	2 semanas	Como Usuaria final requiero o necesito consultar y editar mi perfil para mantener actualizados mis datos y preferencias con un UAT: El sistema debe permitir visualizar y actualizar los datos autorizados del perfil y guardar los cambios correctamente.
3	US	Must	Usuaria final	consultar un módulo educativo sobre fundamentos de seguridad digital y amenazas frecuentes	La aplicación debe mostrar contenidos organizados y accesibles sobre amenazas, prevención y buenas	5	2,5 semanas	Como Usuaria final requiero o necesito consultar un módulo educativo sobre fundamentos de seguridad digital y amenazas frecuentes con un UAT: La aplicación debe mostrar contenidos organizados y accesibles sobre amenazas, prevención y buenas
4	US	Must	Usuaria final	aprender a crear y administrar contraseñas seguras	El módulo debe presentar recomendaciones de longitud, complejidad, unicidad y uso responsable	5	2,5 semanas	Como Usuaria final requiero o necesito aprender a crear y administrar contraseñas seguras con un UAT: El módulo debe presentar recomendaciones de longitud, complejidad, unicidad y uso responsable de contraseñas.
5	US	Must	Usuaria final	*identificar phishing, fraude, suplantación y otras amenazas digitales*	*El contenido debe permitir reconocer señales de alerta y recomendar acciones preventivas ante cada*	5	2,5 semanas	Como Usuaria final requiero o necesito identificar phishing, fraude, suplantación y otras amenazas digitales con un UAT: El contenido debe permitir reconocer señales de alerta y recomendar acciones preventivas ante cada amenaza.
6	US	Must	Emprendedora	*conocer prácticas para proteger mis datos personales y los de mi emprendimiento*	*La aplicación debe explicar principios de protección de datos y buenas prácticas para el manejo de*	8	4 semanas	Como Emprendedora requiero o necesito conocer prácticas para proteger mis datos personales y los de mi emprendimiento con un UAT: La aplicación debe explicar principios de protección de datos y buenas prácticas para el manejo de información.
7	US	Should	Usuaria final	*resolver cuestionarios para comprobar mis conocimientos de seguridad digital*	*El sistema debe presentar preguntas, registrar respuestas y mostrar un resultado o*	5	2,5 semanas	Como Usuaria final requiero o necesito resolver cuestionarios para comprobar mis conocimientos de seguridad digital con un UAT: El sistema debe presentar preguntas, registrar respuestas y mostrar un resultado o retroalimentación.

8	US	Should	Usuaria final	consultar mis avances y logros de aprendizaje	La aplicación debe mostrar el progreso de los módulos y los resultados obtenidos en los cuestionarios.	3	2 semanas	Como Usuaria final requiero o necesito consultar mis avances y logros de aprendizaje con un UAT: La aplicación debe mostrar el progreso de los módulos y los resultados obtenidos en los cuestionarios.
9	US	Must	Usuaria final	activar un Botón SOS para recibir orientación inicial ante una situación de	El Botón SOS debe estar disponible desde la	8	4 semanas	Como Usuaria final requiero o necesito activar un Botón SOS para recibir orientación inicial ante una situación de riesgo digital con un
10	US	Must	Usuaria final	consultar un chatbot para recibir orientación sol	El chatbot debe permitir pregunta:	8	4 semanas	Como Usuaria final requiero o necesito consultar un chatbot para recibir orientación sobre seguridad digital y protección de datos con un UAT: El chatbot debe permitir preguntas frecuentes y entregar respuestas de orientación dentro del alcance definido.
11	US	Should	Emprendedora	aprender prácticas responsables para utilizar her	El módulo debe presentar recom	5	2,5 semanas	Como Emprendedora requiero o necesito aprender prácticas responsables para utilizar herramientas de marketing digital con un UAT: El módulo debe presentar recomendaciones para el uso responsable de datos, comunicaciones y herramientas de
12	US	Should	Usuaria final	configurar preferencias básicas de privacidad y r	La aplicación debe permitir consu	3	2 semanas	Como Usuaria final requiero o necesito configurar preferencias básicas de privacidad y revisar recomendaciones de seguridad con un UAT: La aplicación debe permitir consultar las preferencias disponibles y presentar recomendaciones claras para proteger la

HISTORIA DE USUARIO	Responsable	Actividad	Story Poin	Estatus
Como Usuaria final requiero o necesito registrarme e iniciar sesión de forma segura para acceder a la aplicación con un UAT: El sistema debe validar los datos de acceso y permitir el ingreso únicamente con	Geovanni Andrés Hernández Rubio	Definir flujo de registro e inicio de sesión y criterios de validación.	5	WP
Como Usuaria final requiero o necesito consultar y editar mi perfil para mantener actualizados mis datos y preferencias con un UAT: El sistema debe permitir visualizar y actualizar los datos autorizados del perfil y guardar los cambios correctamente.	David	Diseñar formulario de perfil y validar actualización de datos.	3	WP
Como Usuaria final requiero o necesito consultar un módulo educativo sobre fundamentos de seguridad digital y amenazas frecuentes con un UAT: La aplicación debe mostrar contenidos organizados y accesibles sobre amenazas, prevención y buenas prácticas.	José Luis	Construir contenidos y navegación del módulo de fundamentos de seg	5	WP
Como Usuaria final requiero o necesito aprender a crear y administrar contraseñas seguras con un UAT: El módulo debe presentar recomendaciones de longitud, complejidad, unicidad y uso responsable de contraseñas.	Emilio	Diseñar y validar contenidos sobre contraseñas seguras.	5	TD
Como Usuaria final requiero o necesito identificar phishing, fraude, suplantación y otras amenazas digitales con un UAT: El contenido debe permitir reconocer señales de alerta y recomendar acciones preventivas ante cada amenaza.	Equipo de desarrollo	Implementar contenidos y ejemplos para reconocer amenazas digitales	5	TD

1	HISTORIA DE USUARIO	Responsable	Actividad	Story Poin	Estatus
7	Como Emprendedora requiero o necesito conocer prácticas para proteger mis datos personales y los de mi emprendimiento con un UAT: La aplicación debe explicar principios de protección de datos y buenas prácticas para el manejo de información.	Geovanni Andrés Hernández Rubio	Construir módulo de protección de datos personales y del emprendimi	8	TD
8	Como Usuaria final requiero o necesito resolver cuestionarios para comprobar mis conocimientos de seguridad digital con un UAT: El sistema debe presentar preguntas, registrar respuestas y mostrar un resultado o retroalimentación.	David	Diseñar banco de preguntas, evaluación y retroalimentación.	5	TD
9	Como Usuaria final requiero o necesito consultar mis avances y logros de aprendizaje con un UAT: La aplicación debe mostrar el progreso de los módulos y los resultados obtenidos en los cuestionarios.	José Luis	Implementar vista de progreso y logros.	3	TD
10	Como Usuaria final requiero o necesito activar un Botón SOS para recibir orientación inicial ante una situación de riesgo digital con un UAT: El Botón SOS debe estar disponible desde la aplicación y mostrar instrucciones de actuación y recursos de orientación.	Emilio	Diseñar e integrar Botón SOS y sus orientaciones.	8	TD
11	Como Usuaria final requiero o necesito consultar un chatbot para recibir orientación sobre seguridad digital y protección de datos con un UAT: El chatbot debe permitir preguntas frecuentes y entregar respuestas de orientación dentro del alcance definido.	Equipo de desarrollo	Configurar flujo conversacional y respuestas del chatbot.	8	TD
12	Como Emprendedora requiero o necesito aprender prácticas responsables para utilizar herramientas de marketing digital con un UAT: El módulo debe presentar recomendaciones para el uso responsable de datos, comunicaciones y herramientas de marketing.	Geovanni Andrés Hernández Rubio	Construir módulo de marketing digital responsable.	5	TD
13	Como Usuaria final requiero o necesito configurar preferencias básicas de privacidad y revisar recomendaciones de seguridad con un UAT: La aplicación debe permitir consultar las preferencias disponibles y presentar recomendaciones claras para proteger la información.	David	Implementar preferencias básicas de privacidad y recomendaciones de	3	TD

ID	Sprint	Fecha de reporte	Tipo	Descripción del impedimento e impacto	Acciones preventivas o correctivas	Responsable	Estatus
1	1	17/09/2026	Impedimento - riesgo	Disponibilidad limitada de dispositivos para validar diferentes tamaños d	Priorizar pruebas en dispositivos disponibles, usar emulador y documentar	Equipo de desarrollo	Atendido
2	2	2026-10-08 0:00:00	Impedimento - riesgo	Dependencia de un servicio externo para una eventual integración del chatbot.	Definir respuestas frecuentes locales y dejar la integración externa como componente desacoplado.	José Luis	En proceso
3	2	2026-10-12 0:00:00	Impedimento - riesgo	Necesidad de validar el contenido sobre protección de datos y marketing d	Revisión cruzada del contenido, fuentes académicas y criterios de aceptaci	David	En proceso
4	3	2026-10-29 0:00:00	Impedimento - riesgo	Disponibilidad desigual del equipo para actividades de prueba e integración.	Asignar responsables por historia, mantener seguimiento en el tablero y reprogramar tareas no críticas.	Geovanni Andrés Hernánc	En análisis

Descripción y explicación: Estas hojas permiten observar qué se debe construir, cómo se descompone el trabajo y cuáles situaciones pueden afectar el avance. La relación entre backlog, tareas e impedimentos favorece la trazabilidad del trabajo del equipo.

Complementos

Business Value

El valor de negocio se relaciona con la utilidad que la aplicación puede aportar a las usuarias mediante educación, prevención y orientación frente a riesgos digitales.

Estimation

La estimación mediante Story Points permite expresar de manera relativa el esfuerzo, complejidad y riesgo de las historias de usuario.

Definition of Done

Una historia se considera terminada cuando su funcionalidad ha sido desarrollada, revisada, probada, integrada y documentada de acuerdo con los criterios establecidos.

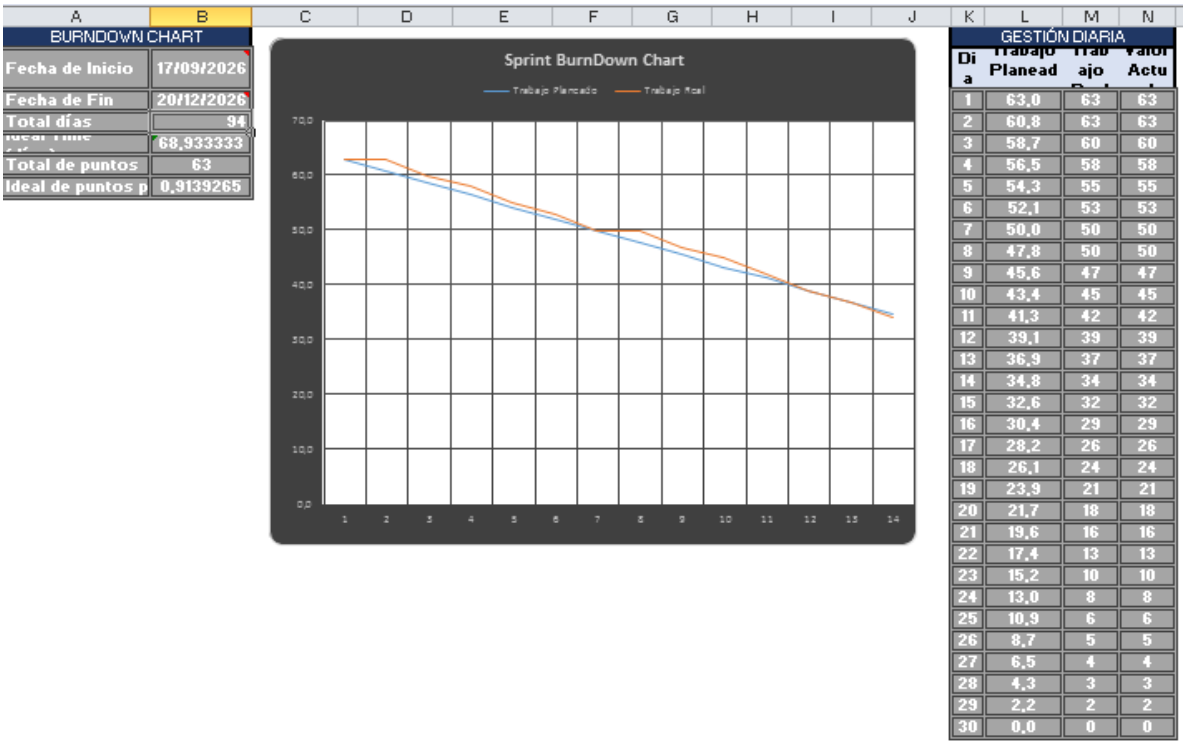
Scrum Board

Permite visualizar el estado de las tareas, por ejemplo: pendiente, en progreso, en revisión y terminada.

Burndown Chart

Permite observar la disminución del trabajo pendiente durante el Sprint y facilita identificar desviaciones respecto al avance esperado

Figura 5: Burndown Chart – Anexo 3



Descripción y explicación: el gráfico permite visualizar el trabajo pendiente frente al transcurso del Sprint. Una tendencia de reducción del trabajo facilita inspeccionar si el equipo mantiene el ritmo esperado y, cuando aparecen desviaciones, tomar acciones de adaptación.

Vínculo archivo en línea Anexo 3 - Plantilla Gestión de Proyectos Ágiles:

Anexo_3_Mujeres_Conectadas_Seguras.xlsx

Avances Prototipado

El prototipado permite representar de forma temprana la solución antes de completar su implementación. Para “Mujeres Conectadas, Seguras” se propone validar principalmente la facilidad de navegación, la comprensión del contenido y el acceso a las funciones de orientación.

Tabla 1

Ficha técnica prototipado

Título de la solución Tecnológica:	Mujeres Conectadas, Seguras
Descripción de la solución tecnológica:	Aplicación móvil educativa y de orientación sobre seguridad digital, protección de datos personales y uso responsable de herramientas de marketing digital.
Software utilizado (wireframe):	Herramienta de prototipado/wireframe seleccionada por el equipo.
Diseño prototipo (boceto/wireframe):	Facilitar el acceso a información práctica y comprensible para reconocer riesgos digitales y adoptar medidas preventivas Navegación por módulos, contenidos educativos, cuestionarios, botón SOS y chatbot de orientación. Interfaz móvil sencilla, con navegación clara y acceso visible a los módulos y recursos principales.

	Realimentación: Debe recopilar observaciones sobre comprensión, facilidad de navegación, utilidad de contenidos, accesibilidad y ubicación de funciones.
Vínculo de visualización (Opcional):	Anexo_3_Mujeres_Conectadas_Seguras.xlsx

Nota. En la tabla se identifica resumen y descripción de prototipado solución tecnológica. Fuente. Autor.

Evidencia Reuniones, acuerdos de grupo para desarrollo de la actividad:

Buenos días compañeros, eatamos ya en la fase 3 del curos, cuyo tema es Gestión del proyecto y esta es la descripción de la actividad para tenerlo en cuenta.

09:55

Esta actividad se desarrolla de forma grupal (Leer muy bien la Guía, la cual encuentra en el espacio de Aprendizaje y Evaluación, momento intermedio).

Fecha de Inicio: 22 de septiembre/2026
Fecha de cierre: 20 de octubre/2026

Actividades a desarrollar:

Dar Continuidad a la propuesta seleccionada en grupo desde Fase 2 y aplicar las fases de desarrollo de la Metodología Ágil Scrum y generación de avances del prototipo del proyecto (baja - media fidelidad).

Desarrollar una Matriz para la gestión de proyectos ágiles, validar Anexo 3. Plantilla Gestión de Proyectos Ágiles.
Generar documento Word donde se compile el informe de aplicación de las diferentes fases de desarrollo de la metodología ágil scrum aplicadas al proyecto tecnológico. Revisar Anexo 4. Informe gestión del proyecto.
Desarrollo del proyecto tecnológico, avances del prototipo (diseño preliminar y desarrollo del prototipo de la solución tecnológica).

Evidencias de aprendizaje (entrega en espacio: Fase 3 - Gestión del Proyecto - Rúbrica de evaluación y entrega de la actividad):

Documento PDF con la siguiente estructura:

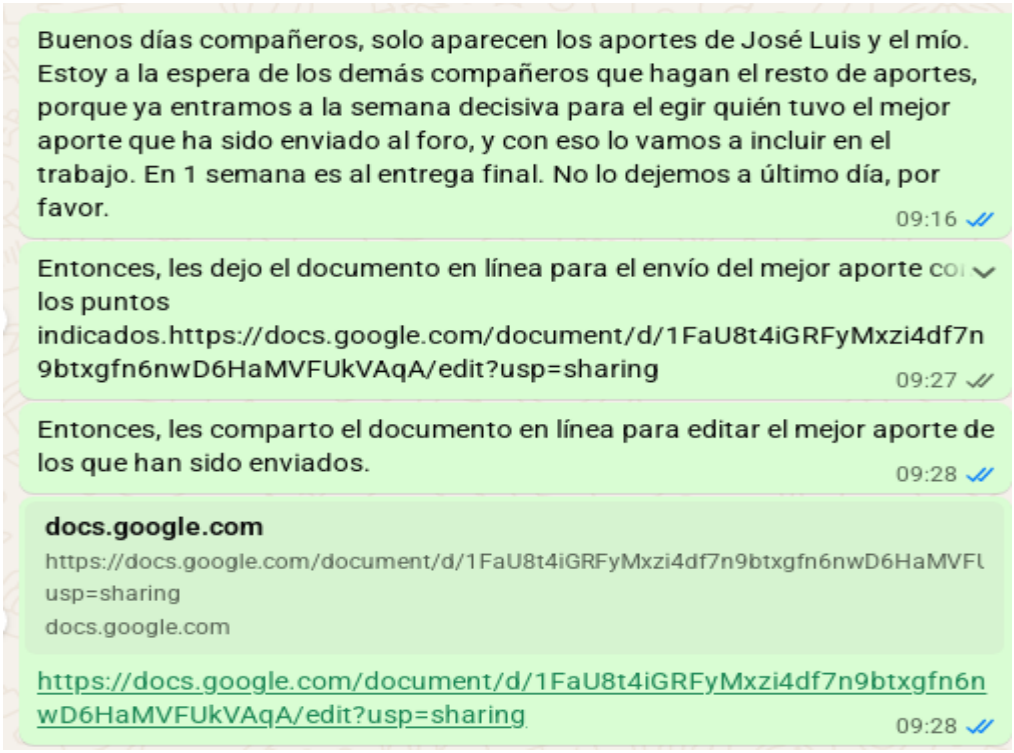
- Portada
- Introducción
- Objetivos
- Desarrollo de la actividad
- Conclusiones
- Referencias Bibliográficas en normas APA

Solo un integrante del grupo realiza la entrega en el entorno de evaluación.

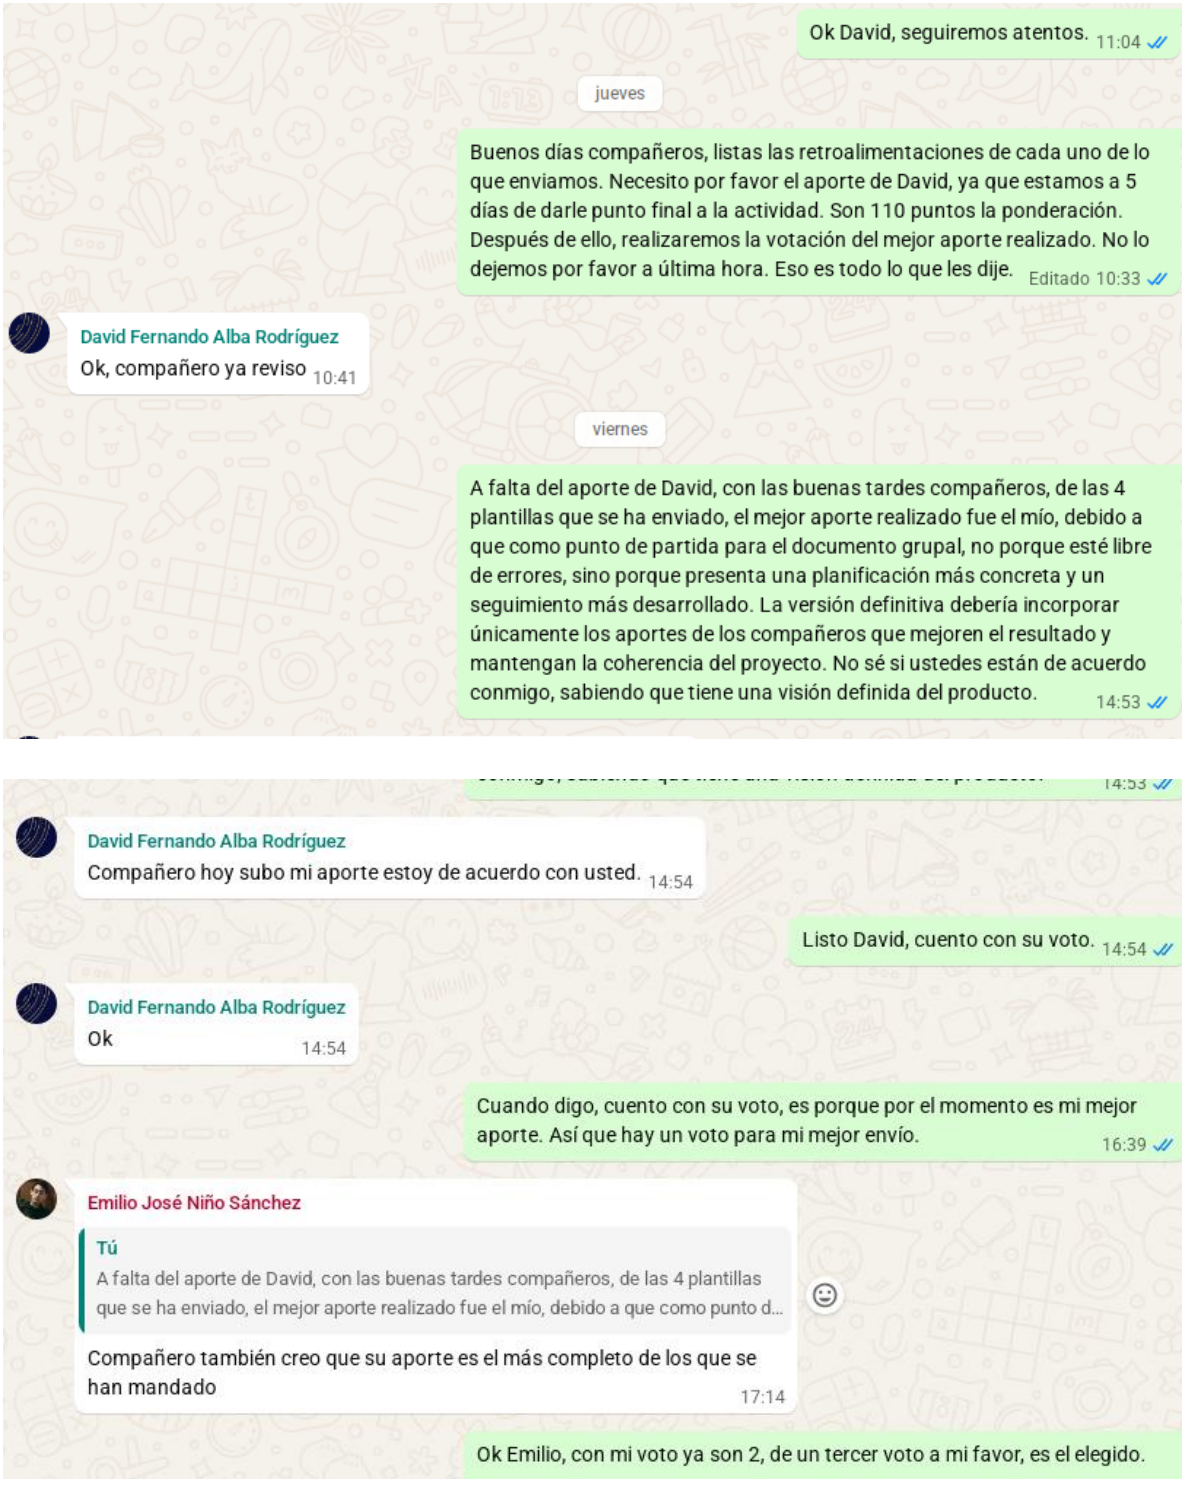
09:56

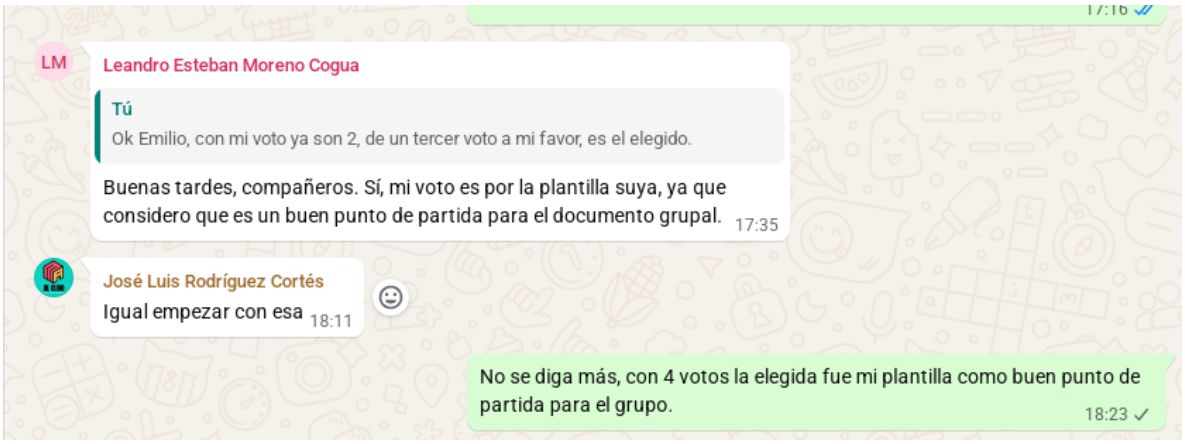
Como tengo mi aporte desarrollado y a la espera del aval del tutor, espero que también ustedes lo hagan también de manera individual, para luego reunirnos con los mejores aportes enviados al foro e incluirlos en el trabajo. El cierre de la actividad es el próximo martes 20 de octubre. Éxitos en la actividad.

Editado 09:58


Buenos días compañeros, solo aparecen los aportes de José Luis y el mío. Estoy a la espera de los demás compañeros que hagan el resto de aportes, porque ya entramos a la semana decisiva para el egir quién tuvo el mejor aporte que ha sido enviado al foro, y con eso lo vamos a incluir en el trabajo. En 1 semana es al entrega final. No lo dejemos a último día, por favor.
09:16
Entonces, les dejo el documento en línea para el envío del mejor aporte co los puntos indicados.https://docs.google.com/document/d/1FaU8t4iGRFyMxzi4df7n9btxgfn6nwD6HaMVFUkVAqA/edit?usp=sharing
09:27
Entonces, les comparto el documento en línea para editar el mejor aporte de los que han sido enviados.
09:28
docs.google.com
https://docs.google.com/document/d/1FaU8t4iGRFyMxzi4df7n9btxgfn6nwD6HaMVFl
usp=sharing
docs.google.com
https://docs.google.com/document/d/1FaU8t4iGRFyMxzi4df7n9btxgfn6nwD6HaMVFUkVAqA/edit?usp=sharing
09:28


Emilio José Niño Sánchez
Tú
Buenos días compañeros, solo aparecen los aportes de José Luis y el mío. Estoy a la espera de los demás compañeros que hagan el resto de aportes, porque ya ...
Hoy lo subo compañero
09:43
Listo Emilio, seguiremos atentos.
09:52
LM
Leandro Esteban Moreno Cogua
De igual forma hoy me pongo al dia
10:27
Igualmente Leandro, seguiremos atentos.
10:28
David Fernando Alba Rodríguez
Buenos días compañero
11:00
Hoy realizó mis aportes
11:00


Ok David, seguiremos atentos. 11:04
jueves
Buenos días compañeros, listas las retroalimentaciones de cada uno de lo que enviamos. Necesito por favor el aporte de David, ya que estamos a 5 días de darle punto final a la actividad. Son 110 puntos la ponderación. Después de ello, realizaremos la votación del mejor aporte realizado. No lo dejemos por favor a última hora. Eso es todo lo que les dije. Editado 10:33
David Fernando Alba Rodríguez
Ok, compañero ya reviso 10:41
viernes
A falta del aporte de David, con las buenas tardes compañeros, de las 4 plantillas que se ha enviado, el mejor aporte realizado fue el mío, debido a que como punto de partida para el documento grupal, no porque esté libre de errores, sino porque presenta una planificación más concreta y un seguimiento más desarrollado. La versión definitiva debería incorporar únicamente los aportes de los compañeros que mejoren el resultado y mantengan la coherencia del proyecto. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, sabiendo que tiene una visión definida del producto. 14:53
David Fernando Alba Rodríguez
Compañero hoy subo mi aporte estoy de acuerdo con usted. 14:54
Listo David, cuento con su voto. 14:54
David Fernando Alba Rodríguez
Ok 14:54
Cuando digo, cuento con su voto, es porque por el momento es mi mejor aporte. Así que hay un voto para mi mejor envío. 16:39
Emilio José Niño Sánchez
Tú
A falta del aporte de David, con las buenas tardes compañeros, de las 4 plantillas que se ha enviado, el mejor aporte realizado fue el mío, debido a que como punto d...
Compañero también creo que su aporte es el más completo de los que se han mandado 17:14
Ok Emilio, con mi voto ya son 2, de un tercer voto a mi favor, es el elegido.


17:16
LM
Leandro Esteban Moreno Cogua
Tú
Ok Emilio, con mi voto ya son 2, de un tercer voto a mi favor, es el elegido.
Buenas tardes, compañeros. Sí, mi voto es por la plantilla suya, ya que considero que es un buen punto de partida para el documento grupal.
17:35
José Luis Rodríguez Cortés
Igual empezar con esa
18:11
No se diga más, con 4 votos la elegida fue mi plantilla como buen punto de partida para el grupo.
18:23

Conclusiones

1. El desarrollo de la Fase 3, denominada *Gestión del proyecto*, permitió fortalecer la planificación y organización del proyecto **Mujeres Conectadas, Seguras**, mediante la aplicación de metodologías ágiles, especialmente Scrum, para estructurar las actividades necesarias para el desarrollo de una aplicación orientada a promover la seguridad digital, la protección de los datos personales y el uso responsable de las herramientas tecnológicas.
2. La elaboración de la matriz de gestión de proyectos ágiles permitió definir los roles y responsabilidades del equipo de trabajo, organizar el Product Backlog e identificar las historias de usuario, las funcionalidades prioritarias y las actividades requeridas para la construcción del producto mínimo viable (MVP). De esta manera, se estableció una ruta de trabajo más clara para avanzar progresivamente en el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
3. La definición de funcionalidades como el botón SOS, los módulos de aprendizaje sobre seguridad digital y el chatbot de orientación permitió reconocer las necesidades de las usuarias y priorizar herramientas que contribuyan a la prevención de riesgos digitales y al fortalecimiento de sus conocimientos sobre privacidad, contraseñas seguras y amenazas informáticas.
4. El trabajo colaborativo fue fundamental para intercambiar ideas, analizar las propuestas de los integrantes y mejorar la planificación del proyecto. Asimismo, la revisión de las historias de usuario, las estimaciones de esfuerzo y la duración de los sprints permitió identificar la importancia de mantener una adecuada coordinación entre los integrantes y ajustar la planificación de acuerdo con la complejidad de las tareas.
5. Finalmente, esta fase permitió comprender que la gestión de un proyecto de ingeniería de software no consiste únicamente en definir funcionalidades, sino también en administrar el tiempo, los recursos, las responsabilidades y los posibles riesgos. La aplicación de los principios ágiles proporciona una base para desarrollar una solución tecnológica organizada, adaptable y centrada en las necesidades de las usuarias, contribuyendo al propósito social de *Mujeres Conectadas, Seguras* y

preparando el camino para las siguientes etapas de desarrollo y validación del proyecto.

Referentes

- Hernández Cruz, L. M., & Bravo Díaz, B. (2022). Metodología AgilePM-S: Una propuesta para la gestión ágil de proyectos académicos de software. CISTI (Iberian Conference on Information Systems & Technologies / Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação) Proceedings, 17, 1–6. https://research-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=e8b0cced-77e3-3aed-a780-657c53576890
- Herrera Uribe, E. (2007). Del manifiesto ágil sus valores y principios. Scientia et Technica, 2(. 34), 381–385. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4809645#?
- Medina Velandia, L. N., & Andrés Gutiérrez, D. (2023). Pautas para optar por una metodología ágil para proyectos de software. Revista Educación En Ingeniería, 19(37), 1–8. https://doi-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/10.26507/rei.v19n37.1292
- Salis, R., & Kusumo, D. S. (2024). Monitoring the Scrum Team Using Internal and External Measure. 2024 2nd International Conference on Software Engineering and Information Technology (ICoSEIT), Software Engineering and Information Technology (ICoSEIT), 2024 2nd International Conference On, 76–81. https://doi-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/10.1109/ICoSEIT60086.2024.10497493
- Saza Garzón, I. D., Pérez Cotes, J. M., Gorrón, N. F. ., Reina , J. G. ., García Villa, J. J. ., Páez Quintero, J. C., & Para , E. . (2022). Metodología SCRUM para el diseño de los videojuegos serios - TUTELAGANAS. Publicaciones E Investigación, 16(4). https://doi.org/10.22490/25394088.6499
- Thouin, M. F., & Hefley, W. E. (2024). Teaching Scrum Product Owner Competencies Using an Experiential Learning Simulation. Journal of Information Systems Education, 35(1), 37–47. https://doi-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/10.62273/GXMA1727

- Hernández, C. D. 2024. SCRUM: Its components, interactions and usefulness in projects.
  [Objeto_virtual_de_aprendizaje_OVA]. Repositorio Institucional UNAD.
  https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60331
